


## ■ I邸改修工事 現場報告書

2014年7月28日

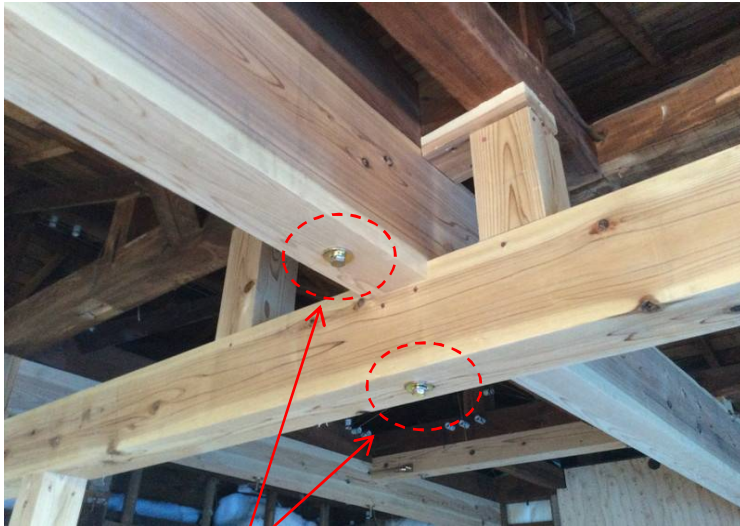

補強用のボルト

2014/7/25(金)  
水廻りの上の小屋組みの構造補強した部分の写真です。先週までは構造材が組みただけでしたが、今週は補強用のボルトが取り付けられているのを確認しました。接合部が外れないようすべてに金物を取り付けて補強します。



2014/7/25(金)  
こちらは台所になる部分の床組みが出来上がった様子です。床組みはこれでほとんど完了しますので、断熱材を詰め込み、電気の配線をした後は部分的に杉の厚板のフローリングを張る作業も始まります。



山内さん

2014/7/25(金)  
この日は渡利さんの応援の大工さんの山内さんが現場を手伝っていただいています。玄関の床を支える大引き材の取付を行っていただいています。応援もあり、工事は順調に進んでいます。

飾り棚になる場所



2014/7/25(金)  
食堂と応接の間の間仕切り壁の間に穴が空けられています。この部分はさらにきれいな仕上げ材を取り除いていき、飾り棚を兼ねた視線の通る壁に造り替える場所になります。少し完成後のイメージがわいてきました。
